

# Controllo ZTL Comune di Pioltello

30-nov-2009

## Comune di Pioltello

<http://www.comune.pioltello.mi.it>

**Project managers:**

**Dates:** 15-gen-2010 - 19-mag-2010

**Complete:** 0%


**Tasks:** 19

**People:** 0

## Tasks

Nome	Data d'inizio	Data di fine
ALLESTIMENTO CANTIERE	15/01/10	06/03/10
Consegna Lavori	15/01/10	16/01/10
Sopralluogo Esecutivo	18/01/10	23/01/10
Installazione cantiere	25/01/10	06/03/10
Scavi	25/01/10	20/02/10
Predisposizione collegamenti fibra	22/02/10	27/02/10
Presisposizione wireless	22/02/10	06/03/10
REALIZZAZIONE IMPIANTI	18/01/10	22/04/10
Approvvigionamento materiale	18/01/10	20/03/10
Opere Edili	22/02/10	06/03/10
Posa in opera Punti Periferici	08/03/10	27/03/10
Posa in opera Sede Centrale	08/03/10	09/03/10
Taratura Sistemi	09/03/10	27/03/10
Prove e verifiche conclusive	29/03/10	17/04/10
Collaudo	19/04/10	21/04/10
Smontaggio cantiere	21/04/10	22/04/10
IMPIANTO ZTL	18/01/10	19/05/10
Omologazione al Ministero	18/01/10	23/01/10
Sperimentazione ZTL	21/04/10	19/05/10

## Diagramma di Gantt

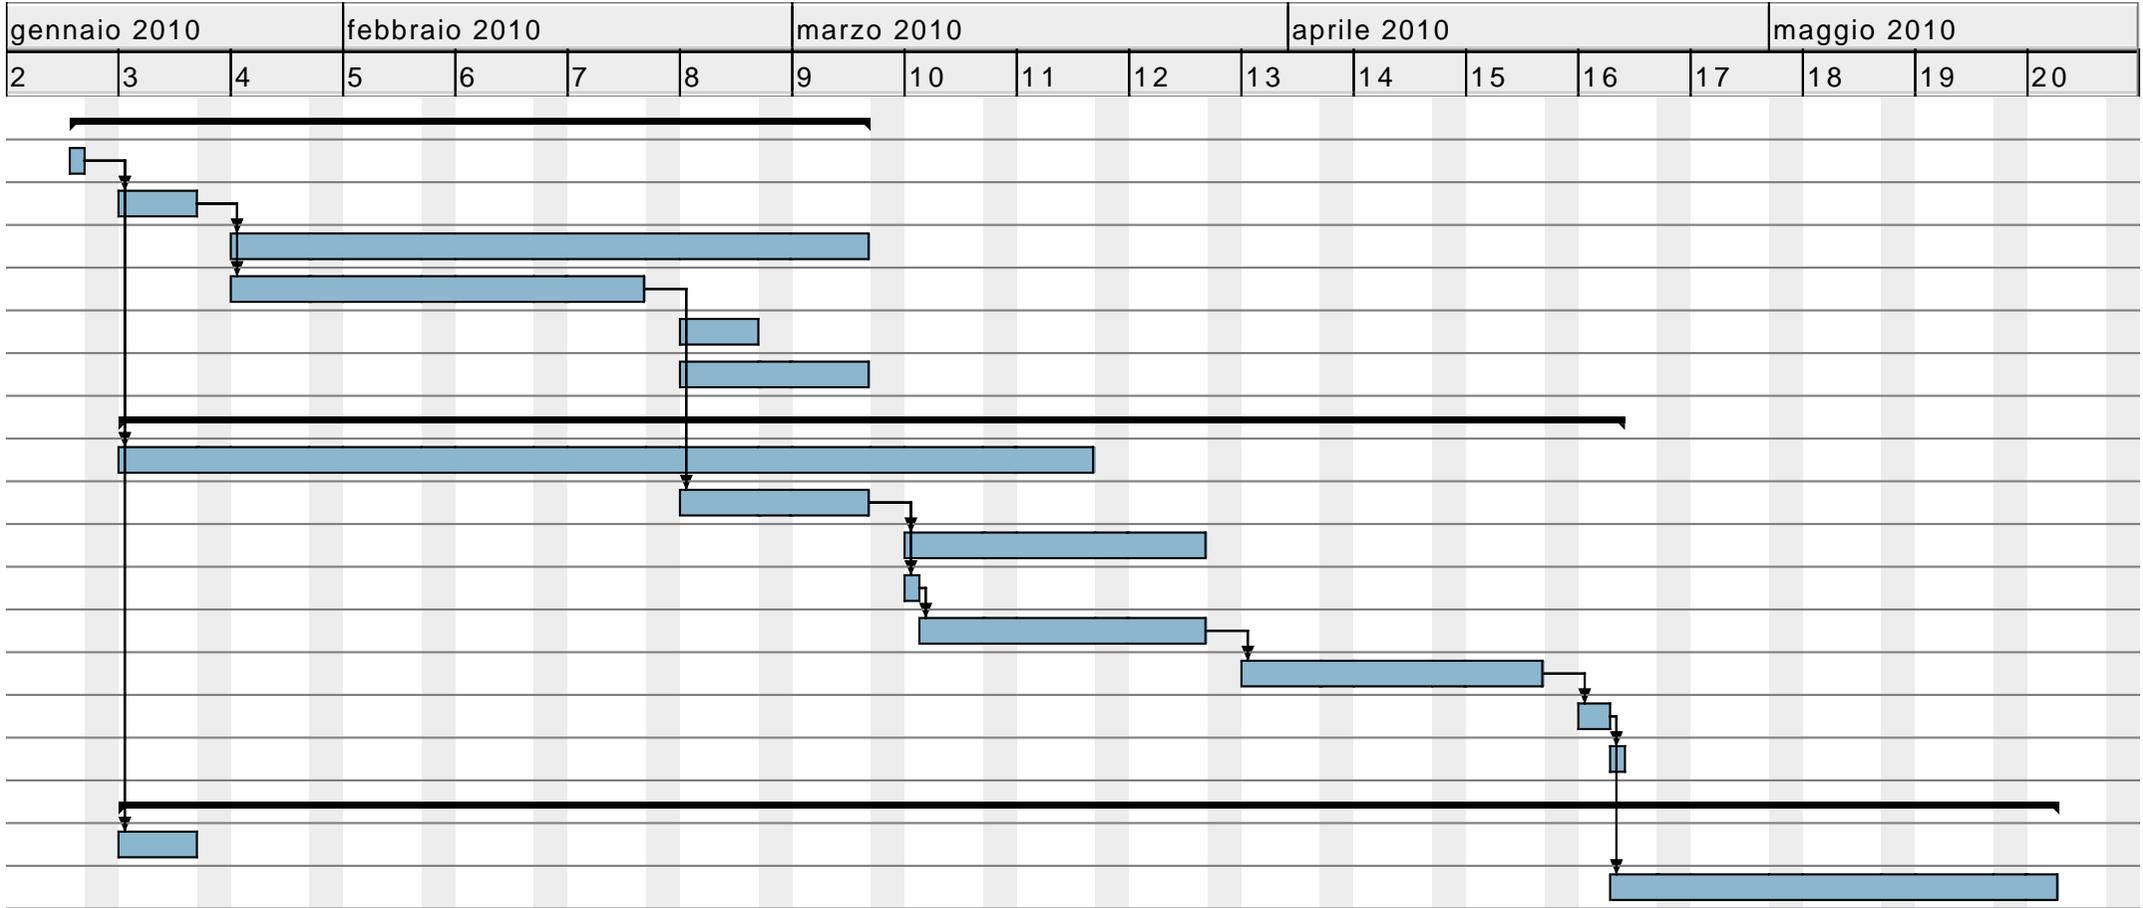

## Diagramma Risorse

gennaio 2010			febbraio 2010				marzo 2010					aprile 2010					maggio 2010		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
